



Universidade Federal de Pernambuco
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (fevereiro de 2024)

REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DO CAMPUS RECIFE DA UFPE.

Data de início: **26/12/2022**

Prazo de execução: **330 dias**

Vigência do contrato: **03/04/2024**

Empresa executora: **MULTICOM CONSTRUTORA LTDA**

Número do contrato: **72/2022**

Engenheiro Fiscal: **Rosenildo Muniz da Silva**

Valor da obra: **R\$ 3.115.176,39**

Valor pago: **R\$ 3.034.635,89**

Percentual executado da obra: **97,41%**

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas cobertas, com o fornecimento e instalação de telhas galvalume, dos ateliês (01 ao 04), sala do LIS, circulações, hall central, corredores, e ainda nos trechos: 1 (biblioteca), 2B (sala 44 e 45), 5 (subestação), 9 (1º andar sobre a sala de danças); aplicação de forros mineral sobre estrutura de sustentação de alumínio, inclusive luminárias, nos ambientes acima citados e o fornecimento e instalação de escada metálica para acesso às cobertas, entre outros.


Relatório fotográfico (fevereiro 2024)



Escada metálica de acesso à cobertura




Todos os forros das salas dos ateliês concluídos

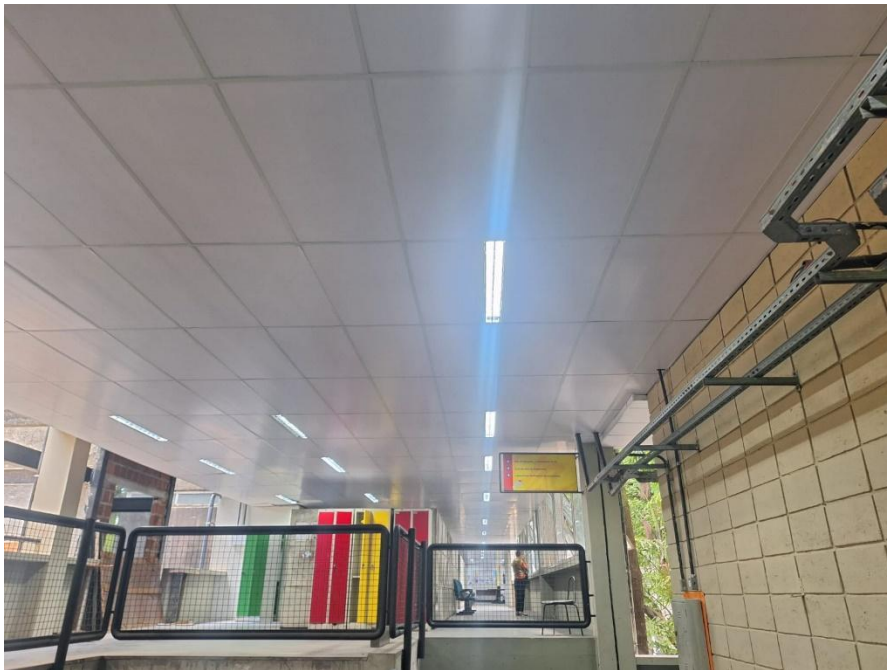

Forro dos corredores concluído



Forro do hall central concluído

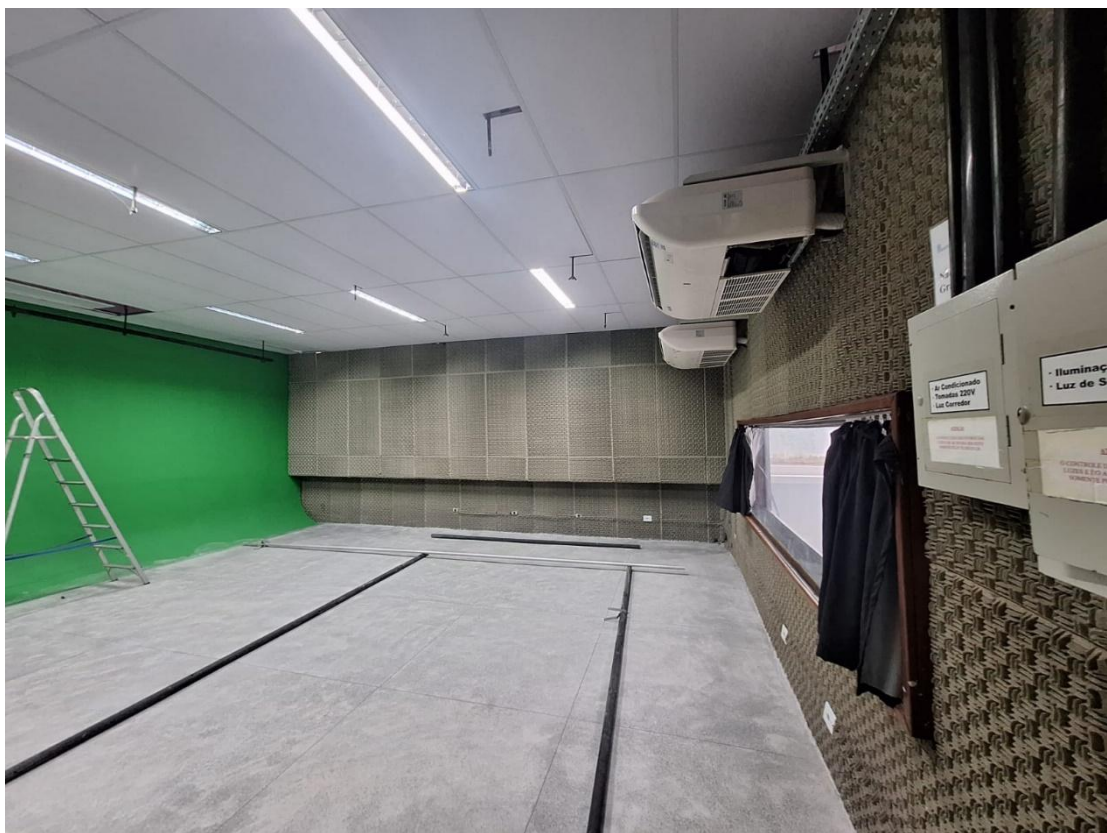

Sala de estúdio de tv finalizada



Forro do ateliê 04 concluído.
