

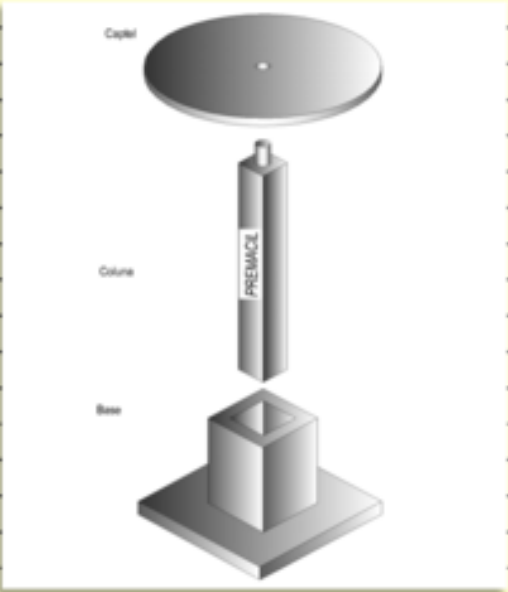


Premoldados e Artefatos de Cimento

Av. Gal Manoel Rabelo, 4012 - Fone (0xx81) 3251 5646 CNPJ 10.657.302/0001-90 - Insc. Est. 0123783-72 CEP 54.160-355 - Sucupira - Jaboatão - PE
E-mail: premacil@premacil.com.br

ATENÇÃO DE	Ariela Andrade	DATA	25.03.2021
E-mail	dpp.ufpe@gmail.com		
ASSUNTO	Orçamento nº	18133/21	

Cliente	DPP / SINFRA / UFPE		
Endereço			
Bairro		Cidade	Estado PE.
CEP		Telefone	(81) 2126-8629 / 9.9989-4004
CNPJ	24.134.488 / 0001-08	Insc Est.	
End. cob.			
Cond pgtº	21 dias no boleto, após aprovação de cadastro.		
Local de entrega	(CIF) Posto obra : Recife - PE		

Item	Unidade	Quant.	Descrição dos Produtos	Preço unit	Preço total
Preço com montagem da estrutura (fundação, base, coluna) por conta da PREMÁCIL. Escavação, (largura 2,20, comprimento 2,20, profundidade 1,50 m), aterro, caixa d'água, instalações elétricas e hidráulicas por conta do cliente.					
1	un	1	Estrutura para caixa d'água de 10.000 l com altura 10,00 m úteis (coluna com 11,30 m e captel com Ø 2,50 m)	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
2	un	1	Base de 2,00 x 2,00 m	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
3	un	1	Caixa d'água de 10.000 litros (opcional)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
					

Validade da Proposta	08 dias	SUB TOTAL	R\$ 14.240,00
Peso Total da Mercadoria		Frete	
Prazo de Entrega	10 dias	TOTAL	R\$ 14.240,00

OBSERVAÇÕES:

- 1º) Para entrega e montagem deste material, o caminhão guincho deve ter acesso a obra.
- 2º) O cliente deve disponibilizar o concreto para chumbamento da coluna no copo da base ($\pm 0,30 \text{ m}^3$) no dia da montagem.
- 3º) Montagem da estrutura e projeto da fundação por conta da PREMÁCIL. Caixa d'água, sondagem, instalações elétricas e hidráulicas por conta do cliente.

Jaboatão, 25 de março de 2021

DE ACORDO:

Josiane Tais O. de Mélo
