



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

1º Aditivo ao Contrato nº 64/2022, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda., na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197, Seção 2, p. 1, de 10 de outubro de 2019, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744-15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MGR Engenharia e Incorporação Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.396.327/0001-92, sediada na Rua José Bonifácio, nº 205, sala 401 e 402, Torre, Recife/PE, CEP: 50.710-435, e-mail: mgrengharia@uol.com.br, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho, Sócio-Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.319.452, expedida pela SSP/PE, e CPF nº 284.064.864-49, com base no contido no processo nº 23076.047740/2023-14, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente aditivo tem por objeto:

- I) **retificar o extrato do Contrato**, publicado no DOU de 21/11/2022, quanto à **data de assinatura contratual para 18/11/2022**, em substituição à data de 11/11/2022; e
- II) **prorrogar**, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda contratual, **por mais 30 (trinta) dias, o prazo de execução do Contrato ora aditado**, correspondente ao período de **30/05/2023 até 28/06/2023**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), restando o **prazo de vigência** prorrogado até **11/10/2023**, considerando os 15 (quinze) e os 90 (noventa) dias necessários, respectivamente, aos recebimentos provisório e definitivo da obra, que totalizam 105 (cento e cinco) dias, de acordo com a referida Cláusula Segunda.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. Em função deste Aditivo, o preço global do Contrato permanece no valor de **R\$ 2.978.120,18** (dois milhões novecentos e setenta e oito mil cento e vinte reais e dezoito centavos), conforme previsão constante do Contrato que se adita, celebrado em 18/11/2022.

2.2. A celebração deste Termo não importa na renúncia a reajuste a que fizer jus a Contratada, cujo pleito deverá ser solicitado à Contratante em conformidade com a Cláusula Sexta contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA

3.1. Para cumprimento da execução do Contrato, a Contratada se obriga a apresentar garantia no valor de **R\$ 148.906,01** (cento e quarenta e oito mil novecentos e seis reais e um centavo), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu preço global, para registro mediante apostila, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do presente aditivo, prorrogável por igual período, quando por ela solicitado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE, sob pena de sua inocorrência caracterizar-se infração contratual, sujeita às penalidades previstas nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda do Contrato ora aditado.

4. CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, **29** de **maio** de 2023.

ALFREDO

MACEDO

GOMES:41972

074415

Assinado de forma
digital por ALFREDO
MACEDO

GOMES:41972074415

Dados: 2023.05.26

14:05:43 -03'00'

CONTRATANTE

Prof. Alfredo Macedo Gomes

Reitor

RG nº 2.680.490 SSP/PE

MAURICIO

ANDRADE

FERREIRA LIMA

FILHO:2840648

6449

Assinado de forma
digital por MAURICIO
ANDRADE FERREIRA
LIMA

FILHO:28406486449

Dados: 2023.05.29

10:38:01 -03'00'

CONTRATADA

Sr. Mauricio Andrade Ferreira Lima Filho

Sócio-Administrador

RG nº 1.319.452 SSP/PE


Testemunhas:

Nome

CPF

Nome

CPF.....

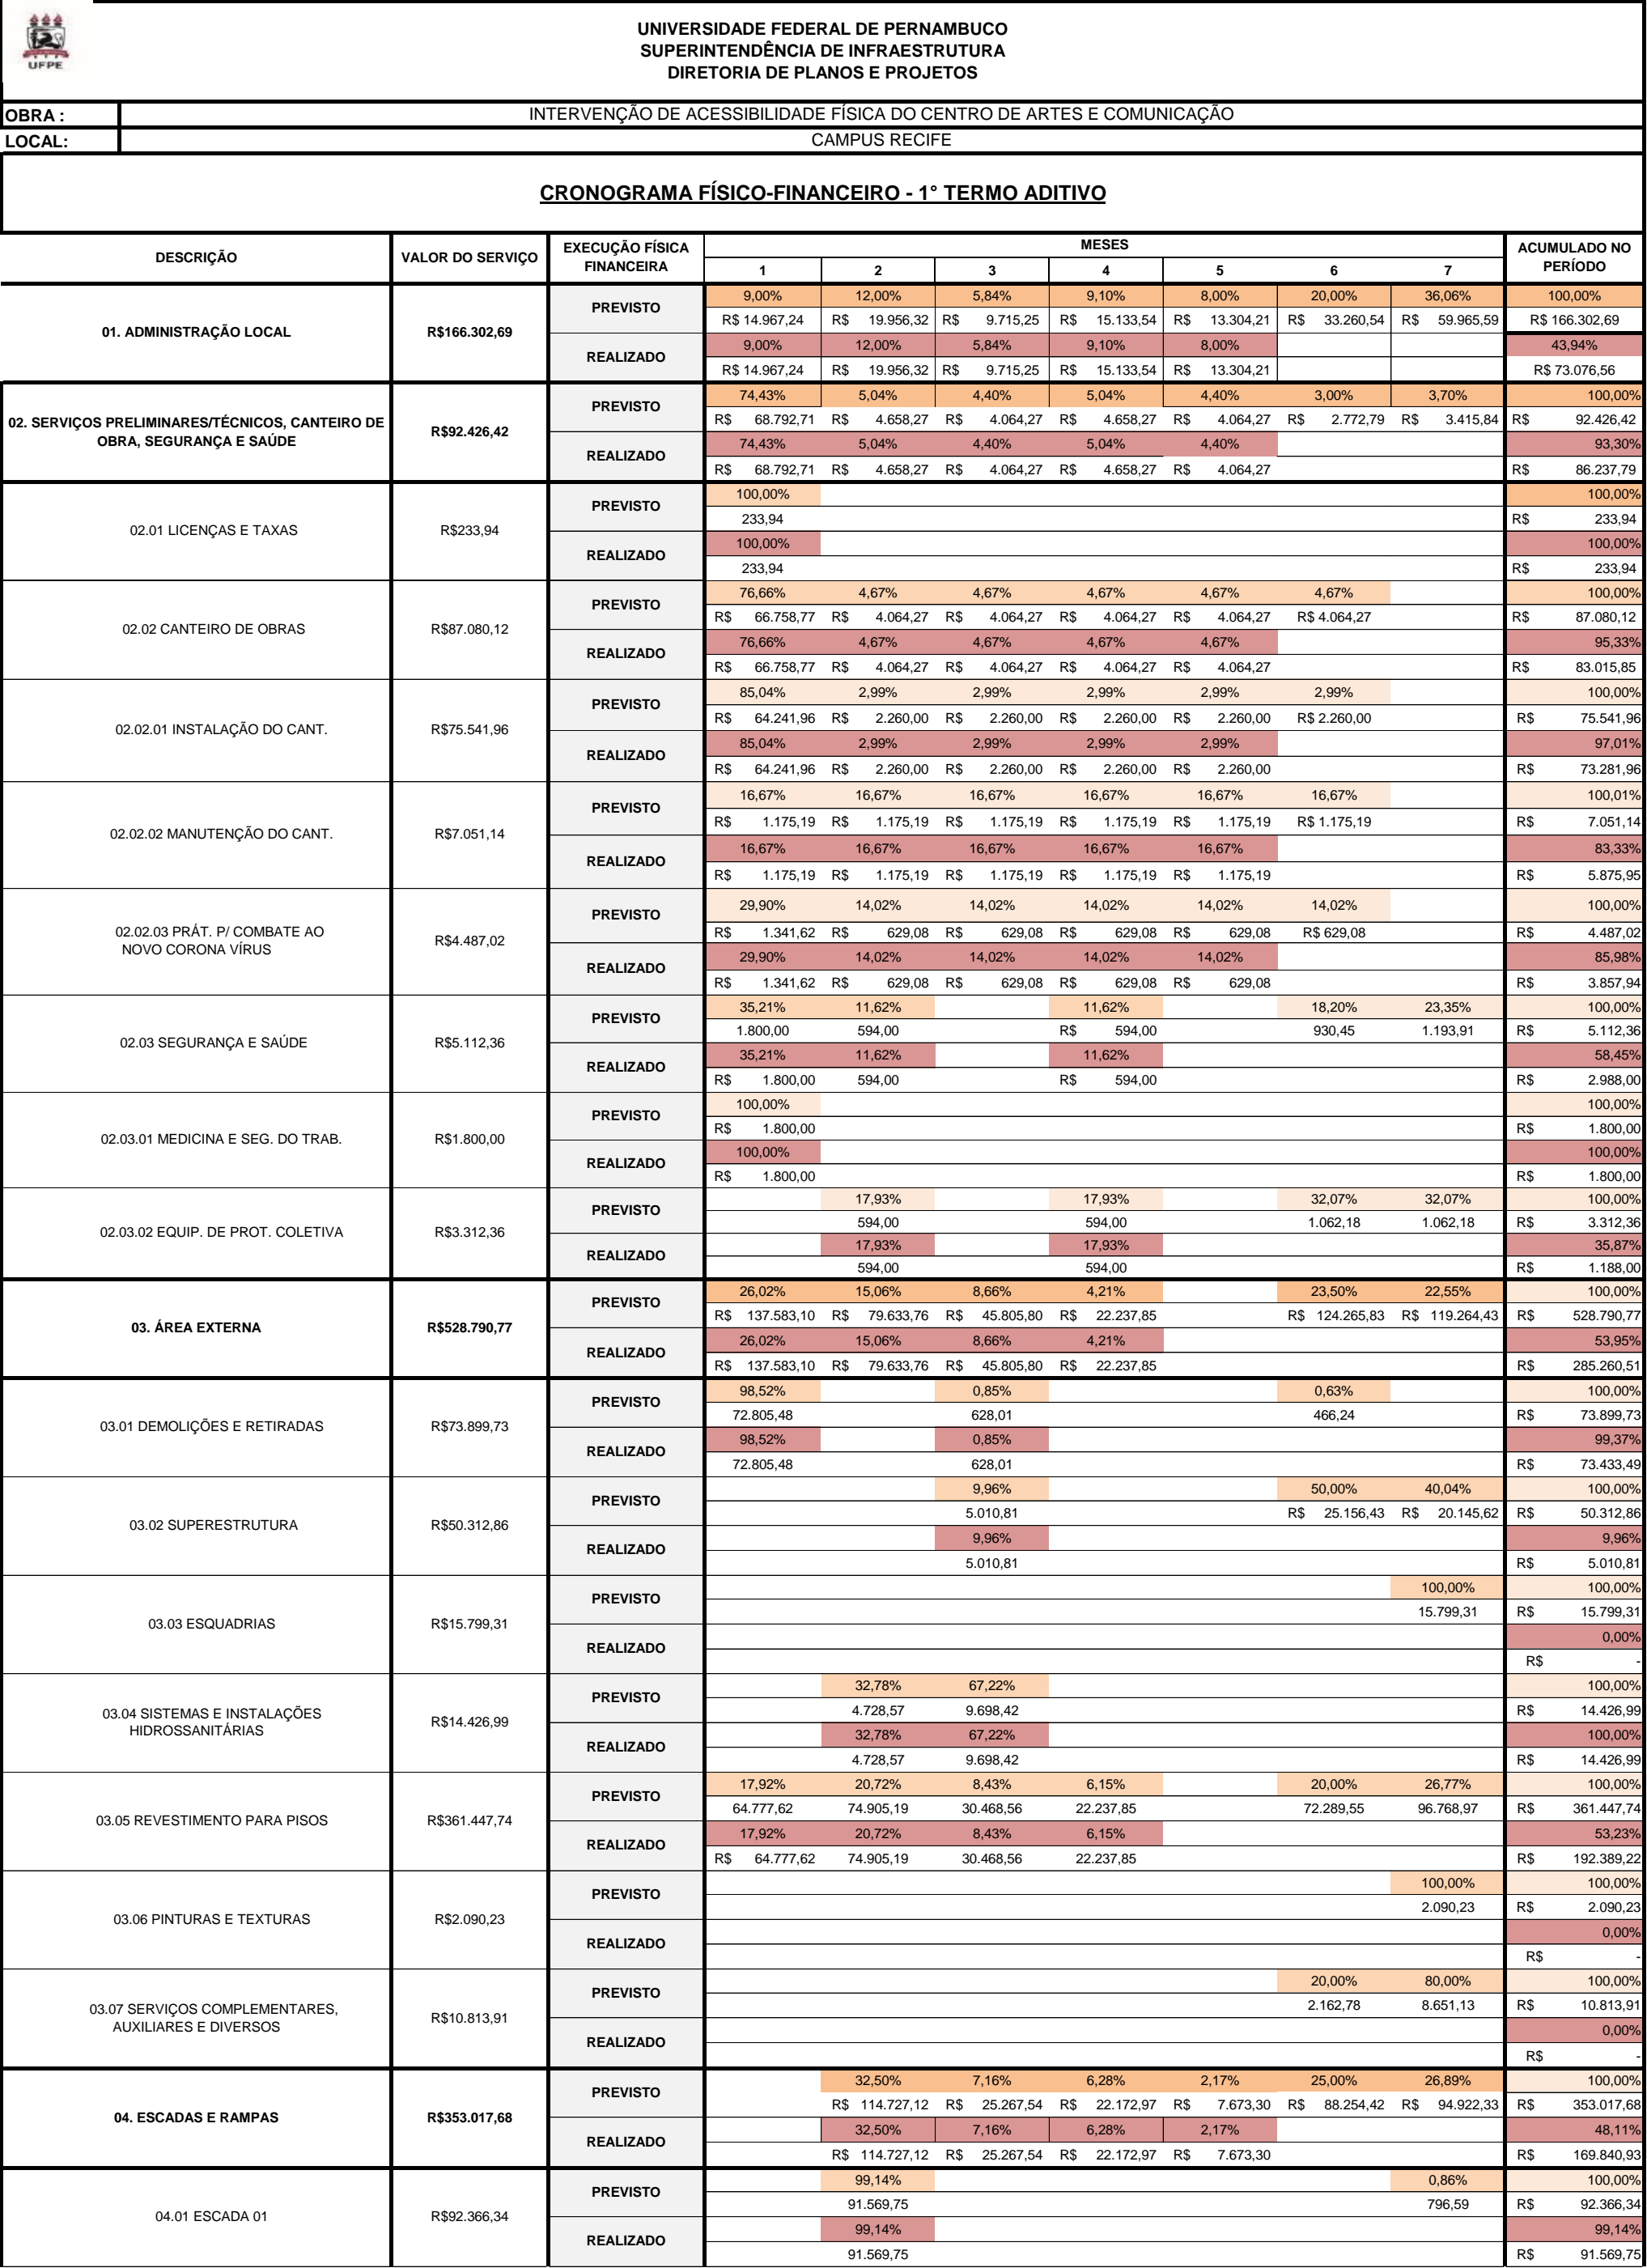

04.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.344,24	PREVISTO	100,00%			100,00%
		2.344,24			R\$ 2.344,24	
		REALIZADO	100,00%			100,00%
		2.344,24			R\$ 2.344,24	
04.01.02 ESQUADRIAS	R\$87.435,53	PREVISTO	99,13%	0,87%		100,00%
		86.673,29	762,24		R\$ 87.435,53	
		REALIZADO	99,13%			99,13%
		86.673,29			R\$ 86.673,29	
04.01.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.460,49	PREVISTO	100,00%			100,00%
		2.460,49			R\$ 2.460,49	
		REALIZADO	100,00%			100,00%
		2.460,49			R\$ 2.460,49	
04.01.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$126,08	PREVISTO	72,76%	27,24%		100,00%
		91,73	34,35		R\$ 126,08	
		REALIZADO	72,76%			72,76%
		91,73			R\$ 91,73	
04.02 ESCADA 02	R\$26.219,06	PREVISTO	95,22%	4,78%		100,00%
		24.965,49	1.253,57		R\$ 26.219,06	
		REALIZADO	95,22%			95,22%
		24.965,49			R\$ 24.965,49	
04.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$939,63	PREVISTO	100,00%			100,00%
		939,63			R\$ 939,63	
		REALIZADO	100,00%			100,00%
		939,63			R\$ 939,63	
04.02.02 ESQUADRIAS	R\$23.283,21	PREVISTO	95,09%	4,91%		100,00%
		22.139,85	1.143,36		R\$ 23.283,21	
		REALIZADO	95,09%			95,09%
		22.139,85			R\$ 22.139,85	
04.02.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$1.886,01	PREVISTO	100,00%			100,00%
		1.886,01			R\$ 1.886,01	
		REALIZADO	100,00%			100,00%
		1.886,01			R\$ 1.886,01	
04.02.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$110,21	PREVISTO		100,00%		100,00%
			110,21		R\$ 110,21	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.03 ESCADA 03	R\$23.342,93	PREVISTO	94,99%	5,01%		100,00%
		22.172,97	1.169,96		R\$ 23.342,93	
		REALIZADO	94,99%			94,99%
		22.172,97			R\$ 22.172,97	
04.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$724,19	PREVISTO	100,00%			100,00%
		724,19			R\$ 724,19	
		REALIZADO	100,00%			100,00%
		724,19			R\$ 724,19	
04.03.02 ESQUADRIAS	R\$20.882,41	PREVISTO	94,52%	2,74%	2,74%	100,00%
		19.739,05	571,68	571,68	R\$ 20.882,41	
		REALIZADO	94,52%			94,52%
		19.739,05			R\$ 19.739,05	
04.03.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$1.638,69	PREVISTO	100,00%			100,00%
		1.638,69			R\$ 1.638,69	
		REALIZADO	100,00%			100,00%
		1.638,69			R\$ 1.638,69	
04.03.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$97,64	PREVISTO	72,76%			72,76%
		71,04			R\$ 71,04	
		REALIZADO	72,76%			72,76%
		71,04			R\$ 71,04	
04.04 ESCADA 04	R\$17.585,28	PREVISTO		36,61%	63,39%	100,00%
			6.438,40	11.146,88	R\$ 17.585,28	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$882,23	PREVISTO	100,00%			100,00%
		882,23			R\$ 882,23	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.04.02 ESQUADRIAS	R\$15.968,10	PREVISTO	35,00%	65,00%		100,00%
		5.588,84	10.379,27		R\$ 15.968,10	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.04.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$690,64	PREVISTO		100,00%		100,00%
			690,64		R\$ 690,64	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.04.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$44,31	PREVISTO		100,00%		100,00%
			44,31		R\$ 44,31	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.05 ESCADA 05 + RAMPA 02	R\$14.069,38	PREVISTO	61,94%	38,06%		100,00%
		8.714,12	5.355,26		R\$ 14.069,38	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$479,52	PREVISTO	100,00%			100,00%
		479,52			R\$ 479,52	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.05.02 ESQUADRIAS	R\$12.737,15	PREVISTO	65,00%	35,00%		100,00%
		8.279,15	4.458,00		R\$ 12.737,15	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	
04.05.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$771,52	PREVISTO		100,00%		100,00%
			R\$ 771,52		R\$ 771,52	
		REALIZADO				0,00%
					R\$ -	

04.05.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$81,19	PREVISTO				100,00%	100,00%	
		REALIZADO				R\$ 81,19	R\$ 81,19	
04.06 ESCADA 06	R\$1.714,65	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			1.714,65		R\$ 1.714,65	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.06.01 ESQUADRIAS	R\$1.264,96	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			632,48	632,48	R\$ 1.264,96	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.06.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$435,00	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			R\$ 435,00		R\$ 435,00	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.06.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$14,69	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			R\$ 14,69		R\$ 14,69	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.07 ESCADA 08	R\$3.891,60	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			1.945,80	1.945,80	R\$ 3.891,60	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.07.01 ESQUADRIAS	R\$3.320,67	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			1.660,34	1.660,34	R\$ 3.320,67	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.07.02 REVESTIM. PARA PISOS	R\$543,35	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			271,68	271,68	R\$ 543,35	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.07.03 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$27,58	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			27,58		R\$ 27,58	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.08 ESCADA 09 + RAMPA 03	R\$129.888,71	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			64.944,36	64.944,36	R\$ 129.888,71	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.08.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.133,38	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			5.133,38		R\$ 5.133,38	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.08.02 ESQUADRIAS	R\$120.621,67	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			60.310,84	60.310,84	R\$ 120.621,67	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.08.03 REVESTIM. PARA PISOS	R\$3.944,85	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			1.972,43	1.972,43	R\$ 3.944,85	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.08.04 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$188,81	PREVISTO				100,00%	100,00%	
		REALIZADO				188,81	R\$ 188,81	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.09 RAMPA 01	R\$20.073,84	PREVISTO			38,23%	30,89%	30,89%	100,00%
		REALIZADO			7.673,30	6.200,27	6.200,27	R\$ 20.073,84
		PREVISTO			38,23%			38,23%
		REALIZADO			7.673,30			R\$ 7.673,30
04.09.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.074,79	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			2.074,79			R\$ 2.074,79
		PREVISTO			100,00%			100,00%
		REALIZADO			2.074,79			R\$ 2.074,79
04.09.02 SUPERESTRUTURA	R\$4.871,87	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			4.871,87			R\$ 4.871,87
		PREVISTO			100,00%			100,00%
		REALIZADO			4.871,87			R\$ 4.871,87
04.09.03 ESQUADRIAS	R\$6.827,03	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%	
		REALIZADO			3.413,52	3.413,52	R\$ 6.827,03	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.09.04 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.220,42	PREVISTO			11,68%	44,16%	44,16%	100,00%
		REALIZADO			726,64	2.746,89	2.746,89	R\$ 6.220,42
		PREVISTO			11,68%			11,68%
		REALIZADO			726,64			R\$ 726,64
04.09.05 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$79,73	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			R\$ 79,73		R\$ 79,73	
		PREVISTO					R\$ -	
		REALIZADO					0,00%	
04.10 RAMPA 04	R\$23.865,89	PREVISTO			97,03%	1,27%	1,70%	100,00%
		REALIZADO			23.157,37	302,05	406,47	R\$ 23.865,89
		PREVISTO			97,03%	1,27%		98,30%
		REALIZADO			23.157,37	302,05		R\$ 23.459,42
04.10.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.842,49	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			5.842,49			R\$ 5.842,49
		PREVISTO			100,00%			100,00%
		REALIZADO			5.842,49			R\$ 5.842,49
04.10.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$260,24	PREVISTO			100,00%		100,00%	
		REALIZADO			260,24			R\$ 260,24
		PREVISTO			100,00%			100,00%
		REALIZADO			260,24			R\$ 260,24

04.10.03 ESQUADRIAS	R\$11.773,11	PREVISTO	96,76%	3,24%	100,00%
			11.391,99	381,12	R\$ 11.773,11
		REALIZADO	96,76%		96,76%
04.10.04 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$359,41	PREVISTO	100,00%		100,00%
			359,41		R\$ 359,41
		REALIZADO	100,00%		100,00%
04.10.05 REVESTIM. PARA PISOS	R\$5.303,24	PREVISTO	100,00%		100,00%
			5.303,24		R\$ 5.303,24
		REALIZADO	100,00%		100,00%
04.10.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$234,35	PREVISTO	100,00%		100,00%
			234,35		R\$ 234,35
		REALIZADO	100,00%		100,00%
04.10.07 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$93,05	PREVISTO	72,76%	27,24%	100,00%
			67,70	25,35	R\$ 93,05
		REALIZADO	72,76%		72,76%
05. DEPARTAMENTO DE MÚSICA	R\$5.828,77	PREVISTO	3,41%	48,29%	100,00%
			R\$ 198,85	R\$ 2.814,96 R\$ 2.814,96	R\$ 5.828,77
		REALIZADO	3,41%		3,41%
05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$212,50	PREVISTO	44,65%	55,35%	100,00%
			94,88	117,62	R\$ 212,50
		REALIZADO	44,65%		44,65%
05.02 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$277,21	PREVISTO	37,51%	62,49%	100,00%
			103,97	173,24	R\$ 277,21
		REALIZADO	37,51%		37,51%
05.03 ESQUADRIAS	R\$223,96	PREVISTO		70,00%	100,00%
				156,77 67,19	R\$ 223,96
		REALIZADO			0,00%
05.04 REVESTIMENTOS PARA PAREDES	R\$4.673,82	PREVISTO		50,00%	100,00%
				2.336,91 2.336,91	R\$ 4.673,82
		REALIZADO			0,00%
05.05 PISO	R\$231,72	PREVISTO		70,00%	100,00%
				162,20 69,52	R\$ 231,72
		REALIZADO			0,00%
05.06 PINTURAS E TEXTURAS	R\$151,08	PREVISTO		100,00%	100,00%
				151,08	R\$ 151,08
		REALIZADO			0,00%
05.07 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$58,48	PREVISTO		100,00%	100,00%
				58,48	R\$ 58,48
		REALIZADO			0,00%
06. DESLOCAMENTO VERTICAL	R\$842.143,01	PREVISTO	1,56%	4,88%	100,00%
			R\$ 13.112,07 R\$ 41.100,00 R\$ 67.645,31 R\$ 4.134,90 R\$ 137.828,61 R\$ 261.064,33 R\$ 317.257,79		R\$ 842.143,01
		REALIZADO	1,56%	4,88%	31,33%
06.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$14.007,27	PREVISTO		100,00%	100,00%
				14.007,27	R\$ 14.007,27
		REALIZADO			0,00%
06.01.01 ELEVADOR 01	R\$14.007,27	PREVISTO		50,00%	100,00%
				7.003,64 7.003,64	R\$ 14.007,27
		REALIZADO			0,00%
06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$4.512,35	PREVISTO	94,16%	5,84%	100,00%
			4.248,83	263,52	R\$ 4.512,35
		REALIZADO	94,16%	5,84%	100,00%
06.02.01 ELEVADOR 02	R\$4.512,35	PREVISTO	94,16%	5,84%	100,00%
			R\$ 4.248,83 R\$ 263,52		R\$ 4.512,35
		REALIZADO	94,16%	5,84%	100,00%
06.03 INFRAESTRUTURA	R\$17.638,00	PREVISTO	50,25%	31,93%	100,00%
			8.863,24	5.631,89	R\$ 17.638,00
		REALIZADO	50,25%	31,93%	82,18%
06.03.01 ELEVADOR 01	R\$6.776,13	PREVISTO	53,62%	46,38%	100,00%
			R\$ 3.633,26	3.142,87	R\$ 6.776,13
		REALIZADO	53,62%		53,62%
06.03.02 ELEVADOR 02	R\$10.861,87	PREVISTO	48,15%	51,85%	100,00%
			R\$ 5.229,98 R\$ 5.631,89		R\$ 10.861,87
		REALIZADO	48,15%	51,85%	100,00%
06.04 SUPERESTRUTURA	R\$246.875,66	PREVISTO		15,81%	100,00%
				39.023,06 103.926,30 103.926,30	R\$ 246.875,66
		REALIZADO		15,81%	15,81%
06.04.01 ELEVADOR 01	R\$70.626,87	PREVISTO		50,00%	100,00%
				35.313,44 35.313,44	R\$ 70.626,87
		REALIZADO			0,00%

06.04.02 ELEVADOR 02	R\$176.248,79	PREVISTO			22,14%	38,93%	38,93%	100,00%		
				39.023,06	68.612,87	68.612,87	R\$ 176.248,79			
		REALIZADO		22,14%			22,14%			
				39.023,06			R\$ 39.023,06			
06.05 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIV.	R\$22.366,40	PREVISTO			47,15%	52,85%	100,00%			
				10.544,80	11.821,60	R\$ 22.366,40				
		REALIZADO				0,00%				
							R\$ -			
06.05.01 ELEVADOR 01	R\$9.587,20	PREVISTO			30,00%	70,00%	100,00%			
				2.876,16	6.711,04	R\$ 9.587,20				
		REALIZADO				0,00%				
							R\$ -			
06.05.02 ELEVADOR 02	R\$12.779,20	PREVISTO			30,00%	70,00%	100,00%			
				3.833,76	8.945,44	R\$ 12.779,20				
		REALIZADO				0,00%				
							R\$ -			
06.06 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.570,95	PREVISTO		65,60%		34,40%	100,00%			
			1.030,48		540,47	R\$ 1.570,95				
		REALIZADO		65,60%		65,60%				
			1.030,48			R\$ 1.030,48				
06.06.01 ELEVADOR 01	R\$540,47	PREVISTO				100,00%	100,00%			
					R\$ 540,47	R\$ 540,47				
		REALIZADO				0,00%				
							R\$ -			
06.06.02 ELEVADOR 02	R\$1.030,48	PREVISTO		100,00%			100,00%			
			1.030,48			R\$ 1.030,48				
		REALIZADO		100,00%		100,00%				
			1.030,48			R\$ 1.030,48				
06.07 ESQUADRIAS	R\$137.724,03	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%			
			0,00	68.862,02	68.862,02	R\$ 137.724,03				
		REALIZADO				0,00%				
							R\$ -			
06.07.01 ELEVADOR 01	R\$51.527,74	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%			
				25.763,87	25.763,87	R\$ 51.527,74				
		REALIZADO				0,00%				
							R\$ -			
06.07.02 ELEVADOR 02	R\$86.196,29	PREVISTO			50,00%	50,00%	100,00%			
				43.098,15	43.098,15	R\$ 86.196,29				
		REALIZADO				0,00%				
							R\$ -			
06.08 SISTEMAS E INSTAL. ELÉTRICAS	R\$12.559,87	PREVISTO		33,04%	32,92%	34,04%	100,00%			
			4.149,90	4.134,90	4.275,07	R\$ 12.559,87				
		REALIZADO		33,04%	32,92%	34,04%	100,00%			
			4.149,90	4.134,90	4.275,07	R\$ 12.559,87				
06.08.01 ELETROD. E ELETROCALHA	R\$8.284,80	PREVISTO		50,09%		24,95%	24,95%	100,00%		
			4.149,90		2.067,45	2.067,45	R\$ 8.284,80			
		REALIZADO		50,09%			50,09%			
			4.149,90			R\$ 4.149,90				
06.08.02 FIOS E CABOS ELÉTRICOS	R\$2.893,50	PREVISTO			100,00%		100,00%			
				2.893,50		R\$ 2.893,50				
		REALIZADO			100,00%		100,00%			
				2.893,50		R\$ 2.893,50				
06.08.03 QUADROS E DISJUNTORES	R\$1.381,57	PREVISTO			100,00%		100,00%			
				1.381,57		R\$ 1.381,57				
		REALIZADO			100,00%		100,00%			
				1.381,57		R\$ 1.381,57				
06.09 REVESTIMENTO PARA PISO	R\$888,48	PREVISTO				100,00%	100,00%			
					888,48	R\$ 888,48				
		REALIZADO				0,00%				
						R\$ -				
06.09.01 ELEVADOR 01	R\$444,24	PREVISTO				100,00%	100,00%			
					444,24	R\$ 444,24				
		REALIZADO				0,00%				
						R\$ -				
06.09.02 ELEVADOR 02	R\$444,24	PREVISTO				100,00%	100,00%			
					444,24	R\$ 444,24				
		REALIZADO				0,00%				
						R\$ -				
06.10 EQUIPAMENTOS	R\$384.000,00	PREVISTO		10,7%	15,0%	24,3%	25,0%	25,0%	100,00%	
			41.100,00	57.600,00		93.500,00	95.900,00	95.900,00	R\$ 384.000,00	
		REALIZADO		10,70%	15,00%		24,35%		50,05%	
			41.100,00	57.600,00		93.500,00	R\$ 192.200,00			
06.10.01 ELEVADOR 01	R\$116.000,00	PREVISTO		15,00%	15,00%		35,00%	35,00%	100,00%	
			17.400,00	17.400,00		40.600,00	40.600,00	R\$ 116.000,00		
		REALIZADO		15,00%	15,00%			30,00%		
			17.400,00	17.400,00			R\$ 34.800,00			
06.10.02 ELEVADOR 02	R\$268.000,00	PREVISTO		8,84%	15,00%	34,89%	20,63%	20,63%	100,00%	
			23.700,00	40.200,00		93.500,00	55.300,00	55.300,00	R\$ 268.000,00	
		REALIZADO		8,84%	15,00%		34,89%		58,73%	
			23.700,00	40.200,00		93.500,00	R\$ 157.400,00			
07. SANITÁRIOS	R\$263.298,49	PREVISTO		2,84%	5,07%	17,76%	15,73%	29,30%	29,30%	100,00%
			R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53	R\$ 77.148,82	R\$ 77.148,82	R\$ 263.298,49	
		REALIZADO		2,84%	5,07%	17,76%	15,73%		41,40%	
			R\$ 7.489,72	R\$ 13.337,78	R\$ 46.761,83	R\$ 41.411,53		R\$ 109.000,86		
07.01 SANITÁRIO 01 - PAVIM. TÉRREO	R\$90.073,61	PREVISTO			25,03%	26,87%	24,05%	24,05%	100,00%	
					22.547,02	24.199,34	21.663,63	21.663,63	R\$ 90.073,61	
		REALIZADO			25,03%	26,87%		51,90%		
				22.547,02	24.199,34		R\$ 46.746,36			
07.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$3.022,85	PREVISTO			50,00%	50,00%		100,00%		
				1.511,40	1.511,40	R\$ 3.022,80				
		REALIZADO			50,00%	50,00%		100,00%		
				1.511,40	1.511,40		R\$ 3.022,80			

07.01.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$4.688,77	PREVISTO		15,86%	48,53%	17,81%	17,81%		100,00%
				743,59	2.275,34	834,92	834,92	R\$	4.688,77
		REALIZADO		15,86%	48,53%				64,39%
				743,59	2.275,34			R\$	3.018,93
07.01.03 ESQUADRIAS	R\$15.266,85	PREVISTO		28,52%	21,48%	25,00%	25,00%		100,00%
				4.353,42	3.280,00	3.816,72	3.816,72	R\$	15.266,85
		REALIZADO		28,52%	21,48%				50,00%
				4.353,42	3.280,00			R\$	7.633,42
07.01.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$34.370,32	PREVISTO		3,27%	46,73%	25,00%	25,00%		100,00%
				1.124,95	16.060,21	8.592,58	8.592,58	R\$	34.370,32
		REALIZADO		3,27%	46,73%				50,00%
				1.124,95	16.060,21			R\$	17.185,16
07.01.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.047,20	PREVISTO			52,38%	23,81%	23,81%		100,00%
					1.072,39	487,41	487,41	R\$	2.047,20
		REALIZADO			52,38%				52,38%
					1.072,39			R\$	1.072,39
07.01.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$23.025,54	PREVISTO		50,00%		25,00%	25,00%		100,00%
				11.512,76		5.756,39	5.756,39	R\$	23.025,54
		REALIZADO		50,00%					50,00%
				11.512,76				R\$	11.512,76
07.01.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$6.601,82	PREVISTO		50,00%		25,00%	25,00%		100,00%
				3.300,90		1.650,46	1.650,46	R\$	6.601,82
		REALIZADO		50,00%					50,00%
				3.300,90				R\$	3.300,90
07.01.08 FORROS	R\$991,10	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						495,55	495,55	R\$	991,10
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.01.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$59,16	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						29,58	29,58	R\$	59,16
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02 SANITÁRIO 02 - PAVIM. TÉRREO	R\$65.074,56	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						32.537,28	32.537,28	R\$	65.074,56
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.509,58	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						754,79	754,79	R\$	1.509,58
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.693,26	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						1.346,63	1.346,63	R\$	2.693,26
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02.03 ESQUADRIAS	R\$9.039,22	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						4.519,61	4.519,61	R\$	9.039,22
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$27.815,04	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						13.907,52	13.907,52	R\$	27.815,04
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$5.128,60	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						2.564,30	2.564,30	R\$	5.128,60
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$14.009,50	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						7.004,75	7.004,75	R\$	14.009,50
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-
07.02.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$4.214,44	PREVISTO				50,00%	50,00%		100,00%
						2.107,22	2.107,22	R\$	4.214,44
		REALIZADO							0,00%
								R\$	-


07.02.08 FORROS	R\$565,64	PREVISTO		50,00%	50,00%	100,00%
				282,82	282,82	R\$ 565,64
		REALIZADO				0,00%
07.02.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$99,28					R\$ -
		PREVISTO		50,00%	50,00%	100,00%
				49,64	49,64	R\$ 99,28
07.03 SANITÁRIO 03 - 1º PAVIMENTO	R\$56.003,39					0,00%
		REALIZADO				R\$ -
						-
07.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.024,57	PREVISTO		30,73%	34,63%	34,63%
				17.212,19	19.395,60	19.395,60
		R\$				56.003,39
07.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$1.850,86	REALIZADO		30,73%		30,73%
				17.212,19		
		R\$				17.212,19
07.03.03 ESQUADRIAS	R\$5.219,23	PREVISTO		50,00%	25,00%	25,00%
				1.012,28	506,15	506,15
		R\$				2.024,57
07.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$20.550,56	REALIZADO		50,00%		50,00%
				1.012,28		
		R\$				1.012,28
07.03.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.101,48	PREVISTO		50,00%	25,00%	25,00%
				925,43	462,72	462,72
		R\$				1.850,86
07.03.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$20.917,84	REALIZADO		50,00%		50,00%
				925,43		
		R\$				925,43
07.03.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.683,22	PREVISTO		50,00%	25,00%	25,00%
				2.609,61	1.304,81	1.304,81
		R\$				5.219,23
07.03.08 FORROS	R\$604,16	REALIZADO		50,00%		50,00%
				2.609,61		
		R\$				2.609,61
07.03.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$51,47	PREVISTO		5,51%	47,25%	47,25%
				1.131,65	9.709,46	9.709,46
		R\$				20.550,56
07.04 SANITÁRIO 04 - 2º PAVIMENTO	R\$52.146,93	REALIZADO		5,51%		5,51%
				1.131,65		
		R\$				1.131,65
07.04.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.595,47	PREVISTO			50,00%	50,00%
					1.050,74	1.050,74
		R\$				2.101,48
07.04.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO				0,00%
						R\$ -
						-
07.04.03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.595,47	PREVISTO		50,00%	25,00%	25,00%
				10.458,91	5.229,47	5.229,47
		R\$				20.917,84
07.04.04 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO		50,00%		50,00%
				10.458,91		
		R\$				10.458,91
07.04.05 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	PREVISTO		40,04%	29,98%	29,98%
				1.074,31	804,46	804,46
		R\$				2.683,22
07.04.06 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO		40,04%		40,04%
				1.074,31		
		R\$				1.074,31
07.04.07 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	PREVISTO			50,00%	50,00%
					302,08	302,08
		R\$				604,16
07.04.08 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO				0,00%
						R\$ -
						-
07.04.09 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	PREVISTO			50,00%	50,00%
					25,74	25,74
		R\$				51,47
07.04.10 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO				0,00%
						R\$ -
						-
07.04.11 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	PREVISTO		14,36%	25,58%	46,44%
				7.489,72	13.337,78	24.214,81
		R\$				3.552,31
07.04.12 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO		14,36%	25,58%	46,44%
				7.489,72	13.337,78	24.214,81
		R\$				3.552,31
07.04.13 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	PREVISTO		100,00%		
				1.595,47		
		R\$				1.595,47
07.04.14 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO		100,00%		
				1.595,47		
		R\$				1.595,47
07.04.15 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	PREVISTO		61,91%		6,66%
				1.496,33		161,00
		R\$				379,77
07.04.16 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO		61,91%		6,66%
				1.496,33		161,00
		R\$				379,77
07.04.17 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	PREVISTO			15,71%	15,71%
		R\$				2.416,87
07.04.18 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$2.416,87	REALIZADO				
		R\$				1.657,33

07.04.03 ESQUADRIAS	R\$9.175,74	PREVISTO		1,49%		33,80%		32,35%	32,35%		100,00%
			136,52			3.101,82		2.968,70	2.968,70	R\$	9.175,74
		REALIZADO		1,49%		33,80%					35,29%
				136,52		3.101,82				R\$	3.238,34
07.04.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$20.543,16	PREVISTO		10,98%		89,02%					100,00%
			2.255,90			18.287,26				R\$	20.543,16
		REALIZADO		10,98%		89,02%					100,00%
				2.255,90		18.287,26				R\$	20.543,16
07.04.05 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$2.047,20	PREVISTO				100,00%					100,00%
						2.047,20				R\$	2.047,20
		REALIZADO				100,00%					100,00%
						2.047,20				R\$	2.047,20
07.04.06 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$12.996,60	PREVISTO		12,16%	87,84%						100,00%
			1.580,77	11.415,83					R\$	12.996,60	
		REALIZADO		12,16%	87,84%						100,00%
				1.580,77	11.415,83					R\$	12.996,60
07.04.07 REVESTIM. PARA PISOS	R\$2.740,02	PREVISTO		15,50%	70,14%			7,18%	7,18%		100,00%
			424,73	1.921,95			196,67	196,67	R\$	2.740,02	
		REALIZADO		15,50%	70,14%						85,64%
				424,73	1.921,95					R\$	2.346,68
07.04.08 FORROS	R\$579,23	PREVISTO				100,00%					100,00%
						579,23				R\$	579,23
		REALIZADO				100,00%					100,00%
						579,23				R\$	579,23
07.04.09 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$52,64	PREVISTO				72,76%		27,24%			100,00%
						38,30		14,34		R\$	52,64
		REALIZADO				72,76%					72,76%
						38,30				R\$	38,30
08. OUTROS AMBIENTES	R\$188.026,48	PREVISTO	1,07%	24,40%	0,50%	37,12%	2,14%	18,75%	16,02%		100,00%
		R\$ 2.016,61 R\$ 45.878,53 R\$ 940,36 R\$ 69.793,08 R\$ 4.025,94 R\$ 35.254,97 R\$ 30.117,00							R\$ 188.026,48		
		REALIZADO	1,07%	24,40%	0,50%	37,12%	2,14%				65,23%
			R\$ 2.016,61 R\$ 45.878,53 R\$ 940,36 R\$ 69.793,08 R\$ 4.025,94							R\$ 122.654,52	
08.01 BIBLIOTECA	R\$47.186,11	PREVISTO	4,27%	87,67%	1,99%	0,93%			5,13%		100,00%
		2.016,61 41.369,95 940,36 436,63				2.422,56	R\$ 47.186,11				
		REALIZADO	4,27%	87,67%	1,99%	0,93%				94,87%	
			R\$ 2.016,61 41.369,95 940,36 436,63					R\$ 44.763,55			
08.01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$828,72	PREVISTO	68,61%	14,86%		16,53%					100,00%
		R\$ 568,61 R\$ 123,16			R\$ 136,95		R\$ 828,72				
		REALIZADO	68,61%	14,86%		16,53%			100,00%		
			R\$ 568,61 R\$ 123,16		R\$ 136,95		R\$ 828,72				
08.01.02 SUPERESTRUTURA	R\$1.327,84	PREVISTO	100,00%								100,00%
		R\$ 1.327,84						R\$ 1.327,84			
		REALIZADO	100,00%						100,00%		
			R\$ 1.327,84				R\$ 1.327,84				
08.01.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$109,04	PREVISTO	100,00%								100,00%
		R\$ 109,04						R\$ 109,04			
		REALIZADO	100,00%						100,00%		
			R\$ 109,04				R\$ 109,04				
08.01.04 ESQUADRIAS	R\$33.216,63	PREVISTO		93,69%				6,31%			100,00%
			R\$ 31.120,47			2.096,16	R\$ 33.216,63				
		REALIZADO		93,69%					93,69%		
			R\$ 31.120,47				R\$ 31.120,47				
08.01.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$79,95	PREVISTO	13,91%	50,00%	86,09%						150,00%
		R\$ 11,12		R\$ 68,83				R\$ 79,95			
		REALIZADO	13,91%		86,09%				100,00%		
			R\$ 11,12		R\$ 68,83		R\$ 79,95				
08.01.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$5.745,42	PREVISTO		100,00%							100,00%
			R\$ 5.745,42					R\$ 5.745,42			
		REALIZADO		100,00%					100,00%		
			R\$ 5.745,42				R\$ 5.745,42				
08.01.07 SERV. AUXILIARES E DIV	R\$5.878,51	PREVISTO		74,52%	14,83%	5,10%			5,55%		100,00%
		R\$ 4.380,90 R\$ 871,53 R\$ 299,68			326,40	R\$ 5.878,51					
		REALIZADO		74,52%	14,83%	5,10%			94,45%		
			R\$ 4.380,90 R\$ 871,53 R\$ 299,68				R\$ 5.552,11				
08.02 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	R\$269,04	PREVISTO						100,00%			100,00%
						269,04	R\$ 269,04				
		REALIZADO							0,00%		
							R\$ -				
08.03 ATELIER	R\$25.945,29	PREVISTO				15,52%	42,24%	42,24%			100,00%
					4.025,94	10.959,68	10.959,68	R\$ 25.945,29			
		REALIZADO				15,52%			15,52%		
					4.025,94		R\$ 4.025,94				
08.03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$374,95	PREVISTO				79,63%	20,37%				100,00%
					298,59	76,36		R\$ 374,95			
		REALIZADO				79,63%		79,63%	159,27%		
					298,59	298,59	R\$ 597,18				
08.03.02 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$210,69	PREVISTO				92,22%	7,78%				100,00%
					194,29	16,40		R\$ 210,69			
		REALIZADO				92,22%		92,22%	184,43%		
					194,29	194,29	R\$ 388,58				
08.03.03 ESQUADRIAS	R\$3.454,25	PREVISTO					50,00%	50,00%			100,00%
						1.727,13	1.727,13	R\$ 3.454,25			
		REALIZADO							0,00%		
							R\$ -				
08.03.04 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$4.532,14	PREVISTO					50,00%	50,00%			100,00%
						2.266,07	2.266,07	R\$ 4.532,14			
		REALIZADO							0,00%		
							R\$ -				
08.03.05 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$186,52	PREVISTO				100,00%					100,00%
					186,52			R\$ 186,52			
		REALIZADO				100,00%			100,00%		
					186,52		R\$ 186,52				

08.03.06 REVESTIM. PARA PISOS	R\$16.861,93	PREVISTO		19,85%	40,08%	40,08%		100,00%
				3.346,54	6.757,70	6.757,70	R\$	16.861,93
		REALIZADO		19,85%		19,85%		39,69%
				3.346,54		3.346,54	R\$	6.693,08
08.03.07 PINTURAS E TEXTURAS	R\$121,62	PREVISTO				100,00%		100,00%
						121,62	R\$	121,62
		REALIZADO						0,00%
							R\$	-
08.03.08 SERV. AUXILIARES E DIV.	R\$203,19	PREVISTO				100,00%		100,00%
						203,19	R\$	203,19
		REALIZADO						0,00%
							R\$	-
08.04 AUDITÓRIOS	R\$15.842,30	PREVISTO			50,00%	50,00%		100,00%
					7.921,15	7.921,15	R\$	15.842,30
		REALIZADO						0,00%
							R\$	-
08.04.01 MINI AUDITÓRIO 01	R\$1.918,43	PREVISTO			50,00%	50,00%		100,00%
					959,22	959,22	R\$	1.918,43
		REALIZADO						0,00%
							R\$	-
08.04.02 MINI AUDITÓRIO 02	R\$7.466,63	PREVISTO			50,00%	50,00%		100,00%
					3.733,32	3.733,32	R\$	7.466,63
		REALIZADO						0,00%
							R\$	-
08.04.03 AUDIT. EVALDO COUTINHO	R\$6.457,24	PREVISTO			50,00%	50,00%		100,00%
					3.228,62	3.228,62	R\$	6.457,24
		REALIZADO						0,00%
							R\$	-
08.05 TEATRO MILTON BACARELLI	R\$98.783,74	PREVISTO	4,56%		70,21%		12,61%	100,00%
			4.508,58		69.356,45		12.459,36	R\$ 98.783,74
		REALIZADO	4,56%		70,21%			74,77%
			4.508,58		69.356,45			R\$ 73.865,03
08.05.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.858,36	PREVISTO	76,96%		5,19%		8,92%	100,00%
			4.508,58		304,15		522,82	R\$ 5.858,36
		REALIZADO	76,96%		5,19%			82,15%
			4.508,58		304,15			R\$ 4.812,73
08.05.02 SUPERESTRUTURA	R\$2.039,24	PREVISTO			100,00%			100,00%
					2.039,24			R\$ 2.039,24
		REALIZADO			100,00%			100,00%
					2.039,24			R\$ 2.039,24
08.05.03 ALVENARIA, VEDAÇ. E DIV.	R\$1.023,80	PREVISTO			100,00%			100,00%
					1.023,80			R\$ 1.023,80
		REALIZADO			100,00%			100,00%
					1.023,80			R\$ 1.023,80
08.05.04 ESQUADRIAS	R\$17.335,65	PREVISTO			87,10%		6,45%	100,00%
					15.100,02		1.117,82	R\$ 17.335,65
		REALIZADO			87,10%			87,10%
					15.100,02			R\$ 15.100,02
08.05.05 SIST. E INST. HIDROSSANIT.	R\$28.590,97	PREVISTO			59,99%		20,01%	100,00%
					17.151,63		5.719,67	R\$ 28.590,97
		REALIZADO			59,99%			59,99%
					17.151,63			R\$ 17.151,63
08.05.06 SIST. E INST. ELÉTRICAS	R\$5.580,02	PREVISTO			66,38%		16,81%	100,00%
					3.703,97		938,03	R\$ 5.580,02
		REALIZADO			66,38%			66,38%
					3.703,97			R\$ 3.703,97
08.05.07 REVESTIM. PARA PAREDES	R\$9.866,00	PREVISTO			70,41%		14,80%	100,00%
					6.946,27		1.459,87	R\$ 9.866,00
		REALIZADO			70,41%			70,41%
					6.946,27			R\$ 6.946,27
08.05.08 REVESTIM. PARA PISOS	R\$18.287,74	PREVISTO			81,34%		9,33%	100,00%
					14.874,39		1.706,68	R\$ 18.287,74
		REALIZADO			81,34%			81,34%
					14.874,39			R\$ 14.874,39
08.05.09 PINTURAS E TEXTURAS	R\$4.660,42	PREVISTO			100,00%			100,00%
					4.660,42			R\$ 4.660,42
		REALIZADO			100,00%			100,00%
					4.660,42			R\$ 4.660,42
08.05.10 FORRO	R\$1.411,75	PREVISTO				50,00%	50,00%	100,00%
						705,88	705,88	R\$ 1.411,75
		REALIZADO						0,00%
								R\$ -
08.05.11 DIVERSOS	R\$4.129,79	PREVISTO			86,02%		6,99%	100,00%
					3.552,56		288,62	R\$ 4.129,79
		REALIZADO			86,02%			86,02%
					3.552,56			R\$ 3.552,56

9. SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	R\$9.819,41	PREVISTO	50,00%50,00%						100,00%
			R\$ 4.909,71R\$ 4.909,71						R\$ 9.819,41
		REALIZADO							0,00%
									R\$ -
09.01 DIVERSOS	R\$7.838,94	PREVISTO	50,00%50,00%						100,00%
			3.919,473.919,47						R\$ 7.838,94
		REALIZADO							0,00%
									R\$ -
09.02 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$1.980,47	PREVISTO	100,00%						100,00%
			1.980,47						R\$ 1.980,47
		REALIZADO							0,00%
									R\$ -
MENSAL PREVISTO (SEM BDI):		R\$236.471,73R\$313.443,72R\$166.975,16R\$184.892,44R\$208.307,86R\$629.746,36R\$709.816,45							
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (ITENS 06.07 E 06.10):		R\$0,00R\$41.100,00R\$57.600,00R\$0,00R\$93.500,00R\$164.762,02R\$164.762,02							
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (ITENS 06.07 E 06.10) (14,97%):		R\$0,00	R\$47.252,67	R\$66.222,72	R\$0,00	R\$107.496,95	R\$189.426,89	R\$189.426,89	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI:		R\$236.471,73	R\$272.343,72	R\$109.375,16	R\$184.892,44	R\$114.807,86	R\$464.984,34	R\$545.054,44	
TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (23,36%):		R\$291.711,53	R\$335.963,21	R\$134.925,20	R\$228.083,31	R\$141.626,98	R\$573.604,69	R\$672.379,15	
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI		R\$291.711,53	R\$383.215,88	R\$201.147,92	R\$228.083,31	R\$249.123,93	R\$763.031,58	R\$861.806,04	
PORCENTAGEM MENSAL :		9,80%	12,87%	6,75%	7,66%	8,37%	25,62%	28,94%	
MENSAL PREVISTO ACUMULADO (COM BDI):		R\$291.711,53	R\$674.927,41	R\$876.075,33	R\$1.104.158,64	R\$1.353.282,57	R\$2.116.314,14	R\$2.978.120,18	
PORCENTAGEM ACUMULADA:		9,80%	22,66%	29,42%	37,08%	45,44%	71,06%	100,00%	

MENSAL REALIZADO (SEM BDI):		R\$236.471,73R\$313.443,72R\$166.975,16R\$184.892,44R\$208.307,86R\$0,00R\$0,00							
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS REALIZADO (ITENS 06.07 E 06.10):		R\$0,00R\$41.100,00R\$57.600,00R\$0,00R\$93.500,00R\$0,00R\$0,00							
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI REALIZADO (ITENS 06.07 E 06.10) (14,97%):		R\$0,00	R\$47.252,67	R\$66.222,72	R\$0,00	R\$107.496,95	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL EXECUÇÃO REALIZADO DA OBRA SEM BDI:		R\$236.471,73	R\$272.343,72	R\$109.375,16	R\$184.892,44	R\$114.807,86	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL EXECUÇÃO REALIZADO DA OBRA COM BDI (23,36%):		R\$291.711,53	R\$335.963,21	R\$134.925,20	R\$228.083,31	R\$141.626,98	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL GERAL REALIZADO DA OBRA COM BDI		R\$291.711,53	R\$383.215,88	R\$201.147,92	R\$228.083,31	R\$249.123,93	R\$0,00	R\$0,00	
PORCENTAGEM MENSAL REALIZADA:		9,80%	12,87%	6,75%	7,66%	8,37%	0,00%	0,00%	
MENSAL REALIZADO ACUMULADO (COM BDI):		R\$291.711,53	R\$674.927,41	R\$876.075,33	R\$1.104.158,64	R\$1.353.282,57	R\$1.353.282,57	R\$1.353.282,57	
PORCENTAGEM ACUMULADA REALIZADA:		9,80%	22,66%	29,42%	37,08%	45,44%	45,44%	45,44%	



Mauricio A. Ferreira Lima Filho
CPF: 284.064.864-49
CREA: 10.758-PE



Emitido em 30/05/2023

TERMO ADITIVO Nº 869/2023 - CGC PROGEST (12.69.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/05/2023 11:43)

FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

COORDENADOR - TITULAR

CGC PROGEST (12.69.11)

Matrícula: 2177340

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:
869, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **30/05/2023** e o código de verificação: **414028ab57**
